



Informe integral i acta de supervisió relatiu al programa de desplegament dels fons **Next Generation EU a Catalunya**



Informe integral i acta de
supervisió relatiu al progra-
ma de desplegament dels
fons **Next Generation EU a**
Catalunya

Informe integral i acta de supervisió relatiu al programa de desplegament dels fons Next Generation EU a Catalunya

Acta de supervisió i control d'impacte

Administració receptora i executora principal: **Generalitat de Catalunya**

Marc financer europeu: **Next Generation EU**

Import global assignat objecte de supervisió: **aproximadament 3.420.000.000 €**

ACTA DE SUPERVISIÓ I CONTROL D'IMPACTE

En data 14 de març de 2026, el Comitè Català i Espanyol de Supervisió, Control i Impacte dels Projectes Finançats per Organismes Internacionals (CCESCIPFOI), en exercici de les competències atribuïdes en matèria de fiscalització tècnica, verificació administrativa i control de conformitat dels recursos procedents d'instruments financers d'origen supranacional, procedeix a la formalització de la present acta de supervisió relativa al conjunt de programes desenvolupats en el territori de Catalunya amb càrrec al mecanisme europeu Next Generation EU, els quals han estat assignats a la Generalitat de Catalunya amb un volum global aproximat de 3.420 milions d'euros destinats a projectes de transformació econòmica, digital, energètica i territorial. La sessió de supervisió s'ha desenvolupat mitjançant la compareixença formal de responsables tècnics i administratius de diversos departaments sectorials del govern autonòmic, la revisió detallada de documentació justificativa associada a l'execució dels programes, la consulta dels sistemes electrònics de seguiment pressupostari i la contrastació de dades procedents de diversos registres administratius. Aquest procés de verificació ha tingut com a finalitat establir una avaluació preliminar sobre l'estat d'execució dels recursos, determinar el grau de correspondència entre els objectius programàtics aprovats i les actuacions materialitzades sobre el territori, així com deixar constància documental de les observacions, incidències i conclusions derivades de les actuacions de control practicades.

En el marc d'aquesta sessió, el Comitè ha analitzat també els mecanismes institucionals de governança implantats per garantir la correcta gestió dels fons europeus, així com els sistemes de coordinació interdepartamental establerts entre les diferents unitats administratives responsables de l'execució dels programes. Aquesta anàlisi ha inclòs la revisió de protocols interns de supervisió financera, procediments de contractació pública, sistemes de registre documental i instruments de control destinats a assegurar la traçabilitat de les decisions administratives adoptades durant el procés de desplegament dels projectes. L'objectiu d'aquest exercici de supervisió és assegurar que els recursos financers mobilitzats en el marc del



mecanisme europeu s'utilitzen d'acord amb els principis de legalitat, transparència, eficiència administrativa i rendició de comptes, garantint al mateix temps que els projectes executats contribueixin efectivament als objectius estratègics de transformació econòmica i social definits per la Unió Europea.

ANTECEDENTS I OBJECTE DE LA SUPERVISIÓ

La creació del mecanisme europeu Next Generation EU constitueix una de les iniciatives financeres més rellevants adoptades per la Unió Europea en resposta a la crisi sistèmica derivada de la pandèmia de COVID-19, la qual va generar un impacte econòmic, social i productiu sense precedents en els estats membres. Aquest instrument extraordinari de recuperació va ser concebut amb l'objectiu d'impulsar processos de transformació estructural orientats a reforçar la resiliència de les economies europees mitjançant inversions estratègiques en àmbits considerats prioritaris, entre els quals destaquen la transició ecològica, la digitalització de les administracions públiques i del teixit empresarial, el desenvolupament tecnològic, la modernització industrial, la innovació científica i la cohesió territorial. En aquest context, els estats membres han desenvolupat plans nacionals de recuperació que estableixen els marcs de distribució i aplicació dels recursos assignats, incorporant objectius específics, indicadors de rendiment i mecanismes de control destinats a garantir la correcta execució dels programes.

En el cas de l'Estat espanyol, una part significativa d'aquests recursos ha estat transferida a les comunitats autònomes amb l'objectiu de facilitar la implementació descentralitzada de projectes transformadors adaptats a les necessitats territorials. En aquest marc, la Generalitat de Catalunya ha estat beneficiària d'un volum aproximat de 3.420 milions d'euros, distribuïts en diverses línies programàtiques que abasten sectors tan diversos com l'energia renovable, la rehabilitació energètica d'edificis, la digitalització de serveis públics, la modernització del sector industrial, el suport a la recerca científica, el desenvolupament de tecnologies avançades i la implementació d'iniciatives destinades a reduir desigualtats territorials. L'objecte específic de la present supervisió consisteix a verificar el grau d'execució d'aquest conjunt de programes, analitzar la coherència entre els objectius estratègics declarats i les actuacions materialitzades, i assegurar que la gestió dels recursos es desenvolupa d'acord amb els criteris establerts per la normativa europea en matèria de control financer i transparència administrativa.

METODOLOGIA APLICADA I ACTUACIONS PRACTICADES

Per tal de dur a terme les tasques de supervisió corresponents a aquesta fase d'avaluació, el Comitè ha adoptat una metodologia de treball basada en la combinació d'instruments d'anàlisi documental, verificació financera, contrast tècnic i inspecció selectiva de projectes amb component físic. En primer lloc, s'ha procedit a una revisió sistemàtica de la documentació administrativa associada als programes finançats, incloent-hi resolucions de concessió d'ajuts, expedients de contractació pública, certificacions de despesa, informes d'execució tècnica, memòries justificatives i altres documents acreditatius de la correcta aplicació dels recursos. Aquesta revisió ha permès identificar el grau d'alineació entre la planificació inicial dels programes i l'evolució real de les actuacions desenvolupades en el territori.

De manera complementària, s'han celebrat diverses sessions de treball amb responsables tècnics dels departaments implicats en la gestió dels fons, amb l'objectiu d'obtenir informació addicional sobre els mecanismes de coordinació institucional, els procediments interns de control pressupostari i els sistemes de seguiment implantats per monitoritzar l'estat d'execució dels projectes. Paral·lelament, el Comitè ha realitzat visites selectives a determinades actuacions amb component infraestructural o tecnològic, especialment aquelles vinculades a instal·lacions energètiques, rehabilitació d'edificis públics i implantació d'infraestructures digitals. Aquest conjunt d'actuacions ha permès obtenir una visió global del funcionament dels programes, identificant bones pràctiques en matèria de gestió administrativa i detectant al mateix temps possibles àrees susceptibles de millora.

ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA DECLARADA I CONCILIACIÓ PRELIMINAR

L'anàlisi de la informació financera disponible indica que els recursos assignats a la Generalitat de Catalunya en el marc del mecanisme Next Generation EU han estat distribuïts entre diverses línies programàtiques que reflecteixen els objectius estratègics establerts a nivell europeu. Una part significativa dels fons s'ha destinat a programes de transició energètica orientats a fomentar la instal·lació de sistemes d'energia renovable, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Paral·lelament, s'han desenvolupat iniciatives dirigides a la digitalització de l'administració pública, incloent projectes de modernització de sistemes informàtics, implantació de plataformes digitals de gestió administrativa i desenvolupament de serveis públics electrònics orientats a millorar l'accessibilitat i l'eficiència dels processos.

La conciliació preliminar entre els imports assignats i les certificacions de despesa analitzades indica que el grau global d'execució financera dels programes se situa aproximadament en el 62 % del pressupost total, xifra que es considera coherent amb el calendari general d'implementació dels projectes. Les desviacions detectades en determinades línies programàtiques es relacionen principalment amb ajustos temporals en l'execució d'actuacions complexes o amb la necessitat d'adaptar alguns projectes a canvis en les condicions tècniques o normatives. Malgrat aquestes circumstàncies, no s'han identificat indicis de desviacions significatives que comprometin la integritat global dels fons ni la correcta consecució dels objectius establerts en el programa europeu.

ABAST URBANÍSTIC VERIFICAT I UNITATS D'OBRA OBSERVADES

En el marc de les actuacions de supervisió desenvolupades pel Comitè, s'ha procedit a analitzar amb detall l'abast territorial i urbanístic de les intervencions executades amb càrrec als recursos del mecanisme Next Generation EU assignats a Catalunya, amb l'objectiu de determinar fins a quin punt els projectes desplegats contribueixen efectivament a la transformació estructural del territori i a la modernització de les infraestructures públiques i productives. L'anàlisi realitzada indica que les actuacions finançades presenten una distribució territorial àmplia i heterogènia, abastant tant grans àrees metropolitanes com municipis de dimensió mitjana i territoris amb menor densitat demogràfica, la qual cosa reflecteix la voluntat institucional d'assegurar una distribució equilibrada dels recursos i evitar concentracions excessives de la inversió en zones específiques del territori. Entre les actuacions verificades destaquen projectes de rehabilitació energètica d'edificis públics, instal·lacions de generació d'energia renovable, desenvolupament d'infraestructures digitals de nova generació, modernització de centres de recerca i innovació, i intervencions destinades a millorar l'eficiència energètica i ambiental d'infraestructures industrials i equipaments públics. Les inspeccions tècniques realitzades sobre el terreny han permès confirmar que les unitats d'obra executades s'ajusten, en termes generals, a les especificacions recollides en les memòries tècniques i projectes constructius aprovats, tot i que en determinats casos s'han introduït adaptacions puntuals motivades per condicionants urbanístics específics, limitacions d'espai o necessitats d'integració amb infraestructures preexistents. Aquest conjunt d'observacions ha estat degudament registrat en l'expedient de supervisió amb l'objectiu de garantir la traçabilitat entre la planificació inicial dels projectes i la seva materialització efectiva sobre el territori.



CRONOGRAMA I DESVIACIONS TEMPORALS

El grau d'execució global del projecte se situa aproximadament en un 38 % respecte al calendari inicialment aprovat, d'acord amb les dades proporcionades en els informes de seguiment tècnic i en les certificacions d'obra corresponents als diferents contractes en execució. Aquesta evolució es considera coherent amb el calendari revisat de treballs aprovat pels òrgans de coordinació del projecte.

Durant el desenvolupament de la Fase I s'han produït determinats ajustos temporals derivats de factors tècnics i operatius, entre els quals destaquen la coordinació amb serveis municipals, la reordenació d'infraestructures soterrades i la necessitat d'adaptar determinats trams del traçat a les condicions urbanístiques existents. Aquestes circumstàncies han requerit modificacions puntuals en la planificació inicial dels treballs.

Malgrat aquests ajustos, l'anàlisi del cronograma actualitzat no evidencia desviacions crítiques que comprometin la finalització del projecte dins del marc temporal revisat. Els responsables tècnics del projecte han adoptat mesures de coordinació addicionals amb l'objectiu de garantir el compliment dels terminis previstos en les fases següents.



CRONOGRAMA D'EXECUCIÓ I ANÀLISI DE DESVIACIONS TEMPORALS

L'avaluació del calendari d'execució dels programes finançats amb càrrec al mecanisme Next Generation EU ha constituït un dels eixos centrals de la present supervisió, atesa la importància que la normativa europea atorga al compliment dels terminis establerts per a la implementació i justificació dels projectes. L'anàlisi dels cronogrames proporcionats pels departaments responsables de l'execució dels programes indica que la major part de les actuacions es troben dins dels marges temporals previstos en la planificació inicial, amb un grau d'execució acumulat que reflecteix una progressió coherent amb el calendari global d'implementació del programa europeu. No obstant això, s'han identificat determinades desviacions temporals en projectes d'elevada complexitat tècnica o administrativa, especialment aquells que requereixen processos de contractació pública prolongats, coordinació amb múltiples administracions o intervencions

en infraestructures existents que presenten condicionants estructurals específics. Aquestes desviacions, que en la majoria dels casos no superen els marges de tolerància habituals en projectes d'aquesta naturalesa, han estat atribuïdes principalment a factors externs com retards en cadenes de subministrament, increments en els terminis d'avaluació tècnica o adaptacions necessàries per garantir el compliment de requisits normatius europeus en matèria ambiental i de sostenibilitat. Malgrat aquestes circumstàncies, l'anàlisi global del calendari d'execució no evidencia en aquesta fase cap risc estructural de pèrdua de recursos ni cap desviació significativa que pugui comprometre el compliment dels objectius generals establerts en el marc del pla europeu de recuperació.

COMPLIMENT TÈCNIC I QUALITAT D'EXECUCIÓ

La verificació del compliment dels estàndards tècnics i normatius aplicables als projectes finançats amb càrrec als fons Next Generation EU ha estat abordada mitjançant l'examen detallat de documentació tècnica, informes d'execució, certificacions d'obra i registres de control de qualitat proporcionats pels responsables dels projectes. Aquest procés d'anàlisi ha permès constatar que la major part de les actuacions executades compleixen de manera satisfactòria els criteris tècnics establerts en els plecs de prescripcions tècniques, així com les normatives sectorials aplicables en àmbits com l'eficiència energètica, la sostenibilitat ambiental, la seguretat estructural i la interoperabilitat de sistemes digitals. En particular, els projectes vinculats a la instal·lació d'infraestructures energètiques renovables i a la rehabilitació energètica d'edificis públics presenten nivells de rendiment energètic que s'ajusten als objectius fixats en la legislació europea en matèria de transició energètica i reducció d'emissions de carboni. De la mateixa manera, els projectes relacionats amb la digitalització de serveis públics i infraestructures tecnològiques han incorporat protocols de seguretat informàtica, sistemes d'interoperabilitat i estàndards de protecció de dades que garanteixen la integritat i la fiabilitat dels sistemes implantats. Aquest conjunt de verificacions permet concloure que, en termes generals, les actuacions desenvolupades presenten un grau adequat d'adequació tècnica i normativa, tot i que el Comitè considera necessari mantenir un seguiment continuat dels indicadors de qualitat durant les fases finals d'execució dels projectes.

COMPONENT DE SEGUIMENT, OPERACIÓ I MANTENIMENT POST-IMPLEMENTACIÓ

Un aspecte rellevant analitzat durant el procés de supervisió ha estat l'existència i adequació dels mecanismes previstos per garantir el seguiment, l'operació i el manteniment de les infraestructures i sistemes implantats un cop finalitzada la fase d'execució dels projectes. En aquest sentit, la documentació examinada indica que la major part dels programes inclouen plans específics de manteniment preventiu i correctiu, així com protocols de monitorització continuada del rendiment dels sistemes instal·lats, especialment en el cas d'infraestructures energètiques i plataformes digitals. Aquests plans contempnen la realització d'inspeccions tècniques periòdiques, la revisió de components crítics, l'actualització de sistemes tecnològics i la recopilació d'indicadors de rendiment que permetin avaluar l'eficàcia de les actuacions a mitjà i llarg termini. El Comitè considera que la correcta implementació d'aquests mecanismes serà fonamental per assegurar que els beneficis derivats dels fons europeus es consolidin de manera sostenible en el temps i no es limitin únicament a la fase inicial d'inversió. Així mateix, es destaca la importància d'assegurar la disponibilitat de recursos pressupostaris suficients per al manteniment de les infraestructures creades, evitant situacions en què la manca de finançament posterior pugui comprometre la funcionalitat o la durabilitat dels projectes.





APRECIACIÓ PRELIMINAR D'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL

Des d'una perspectiva macroeconòmica i territorial, l'anàlisi preliminar realitzada pel Comitè indica que els programes finançats amb càrrec al mecanisme Next Generation EU estan generant un impacte significatiu en diversos sectors de l'economia catalana, especialment en aquells vinculats a l'energia, la construcció, la tecnologia digital i la recerca científica. L'execució dels projectes ha contribuït a mobilitzar inversions complementàries procedents del sector privat, generant un efecte multiplicador que amplifica l'impacte directe dels recursos públics mobilitzats. A més, les actuacions desenvolupades han afavorit la creació d'ocupació qualificada en sectors emergents vinculats a la transició energètica i la digitalització, contribuint així a la modernització del mercat laboral i a la generació de noves oportunitats professionals. En l'àmbit territorial, la distribució dels projectes ha permès impulsar iniciatives en municipis de dimensions diverses, reforçant el potencial de desenvolupament econòmic en zones que tradicionalment han presentat menor nivell d'inversió pública en infraestructures tecnològiques o energètiques. Tot i que l'avaluació completa de l'impacte econòmic i social dels programes requerirà anàlisis més exhaustives un cop finalitzada la seva execució, els indicadors preliminars disponibles suggereixen que les actuacions implementades contribueixen de manera positiva a la transformació estructural del territori i a la millora de la competitivitat econòmica regional.

ABAST TERRITORIAL, URBANÍSTIC I INFRAESTRUCTURAL DE LES ACTUACIONS VERIFICADES

En el transcurs de les actuacions de supervisió desenvolupades pel Comitè Català i Espanyol de Supervisió, Control i Impacte dels Projectes Finançats per Organismes Internacionals (CCESCIPOI), s'ha procedit a analitzar de manera exhaustiva l'abast territorial, urbanístic i infraestructural de les actuacions executades amb càrrec als recursos financers assignats a la Generalitat de Catalunya en el marc del mecanisme europeu Next Generation EU, amb l'objectiu d'avaluar no només el grau de compliment formal dels projectes aprovats sinó també la seva coherència amb els objectius estratègics de transformació econòmica i territorial definits en el pla europeu de recuperació. Aquesta anàlisi ha implicat la revisió detallada de documentació tècnica relativa a intervencions en edificis públics, infraestructures energètiques, instal·lacions tecnològiques, equipaments de recerca i projectes de modernització industrial distribuïts al llarg del territori català, així com la realització d'inspeccions selectives sobre el terreny destinades a verificar la correspondència entre les memòries tècniques aprovades i la materialització efectiva de les actuacions. Les dades recopilades indiquen que les inversions analitzades presenten una distribució territorial relativament equilibrada, amb presència significativa tant en àrees metropolitanes de gran densitat com en municipis de dimensió mitjana o territoris amb menor nivell d'industrialització, circumstància que reflecteix una voluntat institucional explícita de garantir que els beneficis derivats dels recursos europeus es distribueixin de manera homogènia i contribueixin a reduir desigualtats territorials històriques. Entre les actuacions observades destaquen projectes de rehabilitació energètica d'edificis administratius, centres educatius i equipaments sanitaris, instal·lacions de producció d'energia renovable vinculades a programes de transició energètica, infraestructures digitals destinades a millorar la connectivitat i l'eficiència dels serveis públics, així com intervencions en instal·lacions industrials orientades a augmentar la competitivitat i sostenibilitat del teixit productiu regional.

Les verificacions realitzades sobre aquestes unitats d'obra indiquen que, en termes generals, les intervencions executades s'ajusten a les especificacions tècniques aprovades, tot i que en determinats casos s'han introduït modificacions puntuals derivades de condicionants urbanístics específics, limitacions d'espai físic o necessitat d'integració amb infraestructures preexistents, circumstàncies que han estat degudament documentades en els expedients corresponents i que no alteren substancialment els objectius inicials dels projectes. Aquest conjunt d'observacions permet concloure que les actuacions desenvolupades contribueixen de manera efectiva a la modernització de les infraestructures públiques i productives del territori, tot reforçant el paper dels recursos europeus com a instrument de transformació estructural a escala regional.

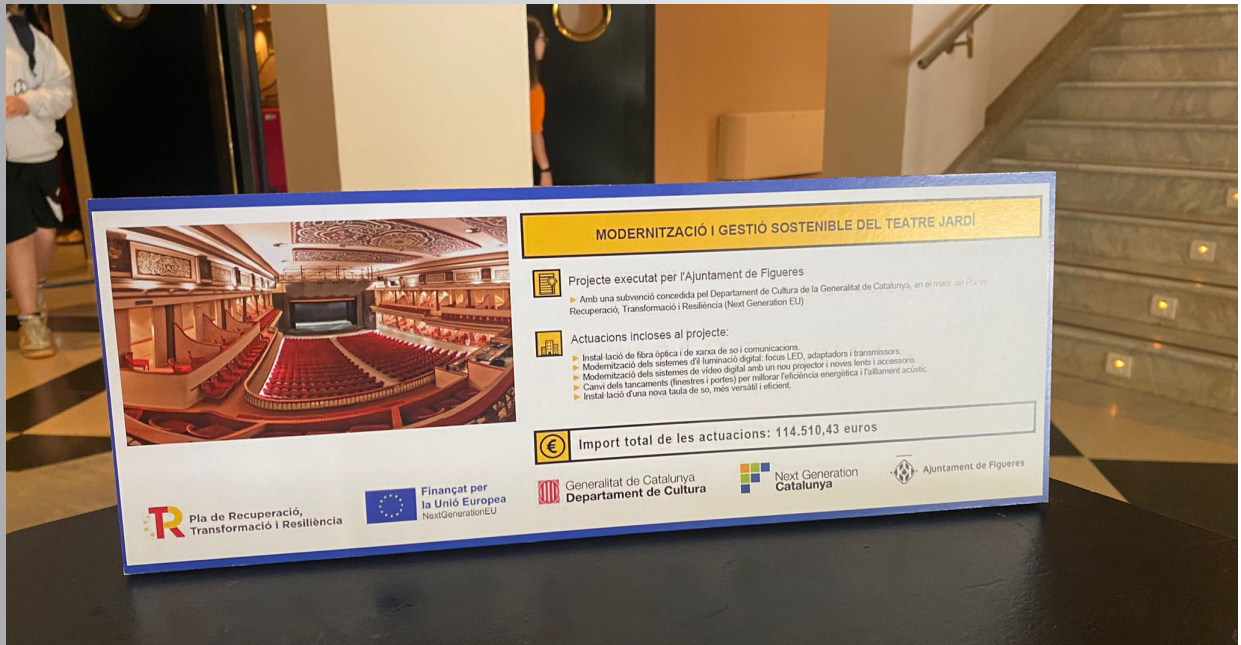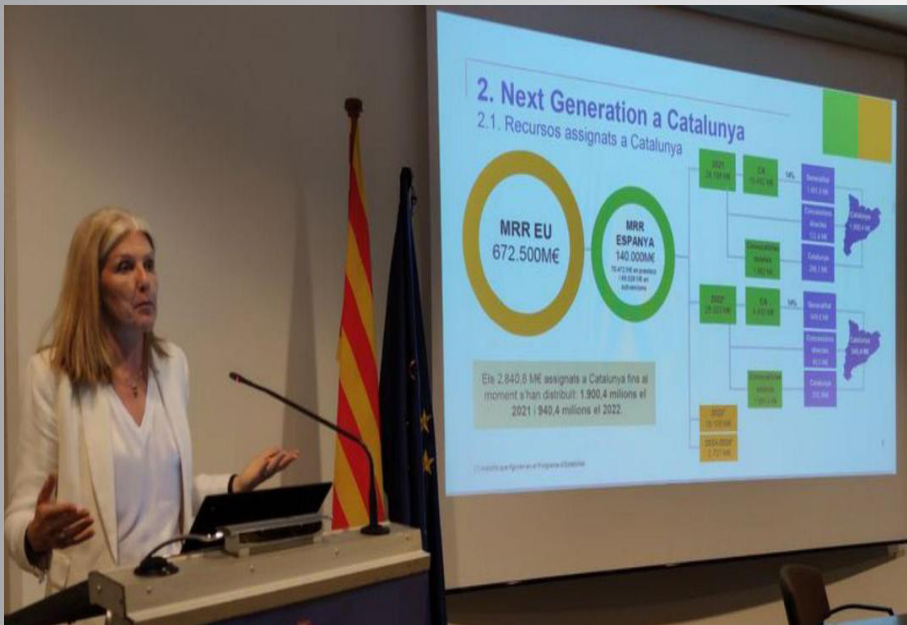

GOVERNANÇA INSTITUCIONAL DELS PROGRAMES I ESTRUCTURA DE COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA

En relació amb l'estructura de governança adoptada per a la gestió, coordinació i supervisió dels programes finançats mitjançant el mecanisme europeu Next Generation EU a Catalunya, el Comitè ha procedit a examinar detalladament els mecanismes institucionals establerts per garantir la correcta planificació, execució i control dels recursos assignats, amb especial atenció a la coordinació interdepartamental dins de l'Administració de la Generalitat i a la interacció amb les institucions estatals i europees responsables de la supervisió global dels fons. L'anàlisi de la documentació disponible indica que la governança dels programes s'articula mitjançant una estructura jeràrquica i funcional que combina òrgans de direcció política, unitats tècniques especialitzades i mecanismes de coordinació administrativa orientats a assegurar la coherència estratègica de les actuacions i la correcta aplicació dels recursos financers. En aquest context, cada departament sectorial responsable de l'execució de projectes específics disposa d'unitats de gestió encarregades de coordinar les actuacions operatives, supervisar el compliment dels requisits normatius i canalitzar la informació necessària cap als òrgans centrals de seguiment i control. Paral·lelament, la Generalitat ha establert mecanismes de coordinació transversal destinats a garantir que les actuacions executades en diferents àmbits sectorials responguin a una visió estratègica comuna alineada amb els objectius del pla europeu de recuperació, circumstància que contribueix a evitar duplicitats, optimitzar l'ús dels recursos disponibles i reforçar la coherència global del programa.

Aquesta arquitectura institucional es complementa amb sistemes de comunicació regular amb les autoritats estatals i europees encarregades de la supervisió dels fons, incloent processos de report periòdic, validació de resultats i revisió d'indicadors d'execució que permeten garantir que les actuacions desenvolupades s'ajusten als criteris establerts en el marc regulador europeu. En conjunt, el Comitè considera que els mecanismes de governança analitzats presenten un grau adequat d'estructuració i formalització administrativa, si bé es recomana continuar reforçant els instruments de coordinació interdepartamental i la sistematització dels processos de presa de decisions amb l'objectiu de consolidar una gestió encara més eficient i transparent dels recursos mobilitzats.

CONTROL FINANCER, TRAÇABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SISTEMES DE REGISTRE ADMINISTRATIU

Pel que fa als mecanismes de control financer i traçabilitat pressupostària aplicats als projectes finançats amb càrrec als recursos del mecanisme Next Generation EU, el Comitè ha examinat els sistemes de registre administratiu i gestió documental utilitzats per la Generalitat de Catalunya per garantir la correcta identificació, seguiment i justificació de les despeses associades als programes analitzats. L'anàlisi realitzada indica que els expedients administratius corresponents als projectes supervisats es troben registrats en plataformes electròniques de gestió documental que permeten mantenir un registre sistemàtic de totes les actuacions administratives relacionades amb la planificació, contractació, execució i justificació dels projectes, incloent contractes públics, convenis de col·laboració, certificacions d'obra, informes tècnics i registres comptables.

Aquests sistemes permeten establir una traçabilitat completa de les operacions financeres associades als programes, facilitant la verificació posterior de les despeses i la realització d'auditories internes o externes en qualsevol fase del procés d'execució. L'examen dels registres pressupostaris i de les certificacions de despesa disponibles ha permès constatar que la major part de les operacions analitzades es troben correctament documentades i associades a partides pressupostàries específiques identificades dins del marc financer del programa europeu, circumstància que contribueix a reforçar la transparència i la fiabilitat del sistema de gestió financera adoptat. Tot i això, el Comitè ha detectat la presència d'algunes incidències menors relacionades amb la classificació documental o amb la necessitat d'homogeneïtzar determinats formats d'informe entre diferents departaments, incidències que no afecten la validesa global del sistema però que podrien ser objecte de millores administratives destinades a reforçar encara més la coherència dels registres i facilitar el treball de supervisió en fases futures.

DEPENDÈNCIA DE PROVEÏDORS, RISCOS DE SUBMINISTRAMENT I CONDICIONANTS DE MERCAT

Un altre aspecte analitzat en el marc del procés de supervisió ha estat el grau de dependència dels projectes finançats respecte a proveïdors externs especialitzats i la possible existència de riscos associats a fluctuacions en els mercats internacionals de subministrament de materials, equips tecnològics o serveis tècnics necessaris per a l'execució de les actuacions. L'examen dels expedients de contractació i de la documentació relativa a l'adjudicació de contractes públics indica que una part significativa dels projectes, especialment aquells vinculats a la instal·lació d'infraestructures energètiques renovables o al desplegament de plataformes digitals avançades, depèn de proveïdors especialitzats amb capacitat tècnica específica i amb presència en mercats internacionals altament competitius. Aquesta dependència pot comportar determinats riscos associats a la disponibilitat de components tecnològics, a l'evolució dels costos de determinats materials o a la capacitat logística dels proveïdors per complir els terminis d'entrega establerts en els contractes. Tot i això, l'anàlisi dels processos de contractació indica que l'Administració ha adoptat mesures preventives destinades a reduir aquests riscos, incloent criteris de solvència tècnica i financera en la selecció de proveïdors, mecanismes de seguiment contractual i clàusules específiques orientades a garantir el compliment dels terminis i condicions d'execució. En conseqüència, el Comitè considera que els riscos associats a la dependència de proveïdors externs es mantenen dins de paràmetres raonables i que les mesures adoptades fins al moment permeten mitigar de manera efectiva l'impacte potencial de factors externs sobre el desenvolupament dels projectes.

CLASSIFICACIÓ D'INCIDÈNCIES, OBSERVACIONS I POSSIBLES NO CONFORMITATS

Durant el procés de supervisió s'han registrat diverses incidències i observacions relatives a aspectes administratius, tècnics o documentals dels projectes analitzats, les quals han estat classificades pel Comitè segons el seu nivell d'impacte potencial sobre el correcte desenvolupament dels programes finançats. La major part d'aquestes incidències s'han catalogat com a incidències menors, principalment vinculades a ajustos documentals, diferències en formats d'informe, retards puntuals en la càrrega de documentació en sistemes electrònics o discrepàncies formals en la classificació administrativa d'alguns expedients. Aquest tipus d'incidències, habituals en programes de gran escala amb múltiples actors institucionals implicats, no afecten de manera substancial la legalitat ni la funcionalitat de les actuacions executades i poden ser corregides mitjançant procediments administratius ordinaris sense necessitat d'adoptar mesures extraordinàries. El Comitè no ha identificat, en el moment de la supervisió, cap no conformitat estructural que pugui comprometre la validesa dels projectes o la correcta aplicació dels recursos europeus, si bé s'han formulat recomanacions específiques destinades a millorar la coherència dels sistemes de registre documental, reforçar la coordinació entre unitats administratives i garantir la uniformitat en la presentació d'informes tècnics i financers.

CONCLUSIÓ GENERAL I QUALIFICACIÓ GLOBAL DEL PROGRAMA

A la vista del conjunt d'actuacions de supervisió desenvolupades, de l'anàlisi de la documentació administrativa i tècnica examinada, de les verificacions realitzades sobre el terreny i de l'avaluació dels indicadors preliminars d'execució financera i operativa, el Comitè Català i Espanyol de Supervisió, Control i Impacte dels Projectes Finançats per Organismes Internacionals considera que el programa de desplegament dels fons Next Generation EU a Catalunya presenta, en el moment actual, un nivell global de compliment satisfactori tant des del punt de vista tècnic com financer i administratiu. Les actuacions executades fins al moment mostren una correspondència adequada entre els objectius declarats en la planificació inicial i els



resultats observats durant la fase d'implementació, mentre que els mecanismes de governança i control establerts permeten garantir un grau suficient de transparència, traçabilitat i responsabilitat institucional en la gestió dels recursos mobilitzats. Tot i l'existència d'algunes incidències menors pròpies de programes d'aquesta dimensió, no s'han detectat irregularitats significatives ni desviacions estructurals que puguin comprometre la correcta execució dels fons assignats ni la consecució dels objectius estratègics definits en el marc del pla europeu de recuperació. En conseqüència, el Comitè emet una qualificació favorable provisional respecte al conjunt dels programes analitzats, condicionada al manteniment dels mecanismes de control existents, al compliment dels requeriments d'esmena formulats i a la continuïtat dels sistemes de seguiment implementats fins al moment.

CLÀUSULA FINAL DE REGISTRE, ARXIU I REFERÈNCIA PER A AUDITORIES FUTURES

El present document s'incorpora formalment a l'arxiu institucional del Comitè com a registre oficial de les actuacions de supervisió realitzades en relació amb el programa de desplegament dels fons Next Generation EU a Catalunya, amb la finalitat de servir com a referència documental per a futures auditories, revisions administratives o processos d'avaluació comparativa que puguin dur a terme tant les autoritats estatals com les institucions europees competents en matèria de control financer i supervisió de programes de recuperació. Aquesta incorporació garanteix la preservació íntegra de la informació recopilada durant el procés de supervisió i assegura la disponibilitat d'un registre detallat de les observacions, conclusions i recomanacions formulades pel Comitè, contribuint així a reforçar els principis de transparència, responsabilitat institucional i rendició de comptes que regeixen la gestió dels recursos públics d'origen europeu. Així mateix, el document queda obert a eventuais actualitzacions o ampliacions derivades de futures actuacions de control, inspeccions tècniques o revisions administratives que puguin resultar necessàries en el marc del cycle complet de gestió dels programes finançats, sense perjudici de les competències que corresponen als organismes d'auditoria nacionals i europeus en matèria de verificació final dels fons.





*El contingut d'aquesta publicació ha sigut creada per ccescipoi, el **Comite Català i Espanyol de Supervisió Control i Impacte dels Projectes Finançats per Organismes Internacionals***
